



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
Surin Provincial Health Office

# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน




นโยบายกระทรวง  
สาธารณสุข

31 สิงหาคม 2566




# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาล 17 แห่ง

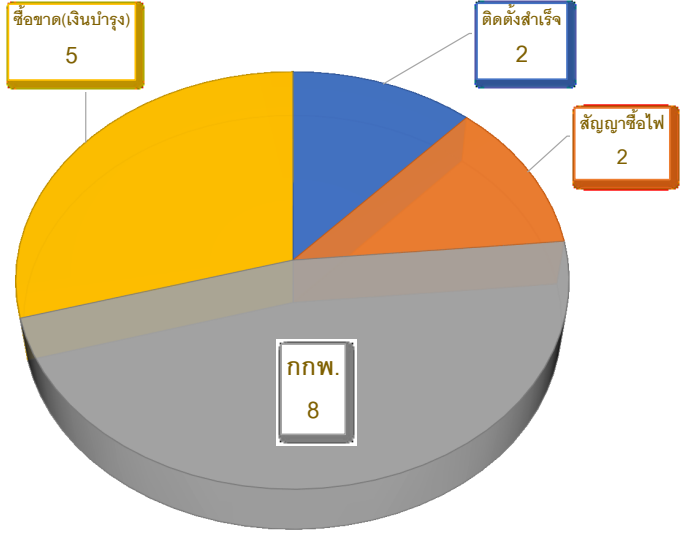

สสจ. , สสอ. 17 แห่ง

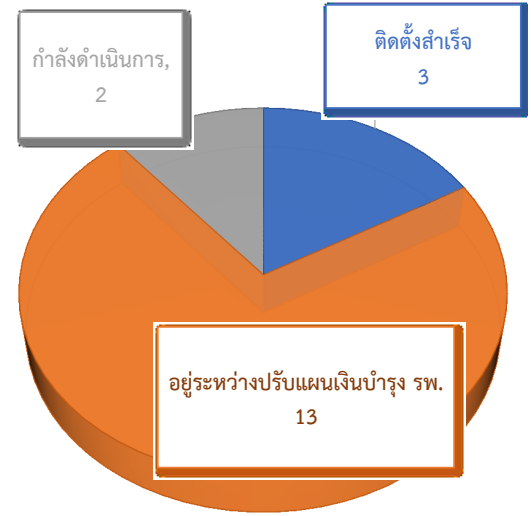



# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

## กลุ่มโรงพยาบาลที่ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จ

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	ขนาด KW	สัญญา	การดำเนินงาน
1	โรงพยาบาลพนมดงรักฯ	-	50	สกทอ.	ติดตั้งและส่งมอบแล้ว 30/09/2563
2	โรงพยาบาลศีขรภูมิ	6,000,000	120	เอกชน	ติดตั้งและส่งมอบแล้ว 08/03/2566

## กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบสัญญาซื้อไฟฟ้า

ลำดับ	หน่วยงาน	ขนาด KW	สัญญา	MOA	การดำเนินงาน (25 กค 2566)	ความก้าวหน้า (23 สค 2566)
1	โรงพยาบาลสุรินทร์	600	กฟภ.	รอ	อยู่ระหว่างรอการตอบรับเข้าร่วมโครงการ	เปลี่ยนสัญญาจาก กฟน./ลงนามปลาย กย.66
2	โรงพยาบาลสังขะ	1,000	กฟภ.	รอ	อยู่ระหว่างรอการตอบรับเข้าร่วมโครงการ	เปลี่ยนสัญญาจาก กฟน./รอ MOA จาก กฟภ.



# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7

กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบ **ซื้อขาย** (เงินบำรุง)

ลำดับ	หน่วยงาน	ขนาด KW	งบประมาณ (บาท)	สัญญา	การจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินงาน 25 กค 2566	ความก้าวหน้า 23 สค 2566
1	โรงพยาบาลปราสาท	550	16,000,000	เอกชน	E-bidding	ร่าง คกก.TOR	อยู่ระหว่างประกาศแผนใน EGP (นำเสนอแผน นพ.สสจ)
2	โรงพยาบาลรัตนบุรี	199.8	6,400,000	กฟน.	เฉพาะเจาะจง	ร่าง คกก.TOR	รอหนังสือตอบรับจาก กฟน.
3	โรงพยาบาลจอมพระ	100	3,300,000	กฟภ.	เฉพาะเจาะจง	ร่าง คกก.TOR	มี TOR คาดว่าลงนามสัญญา ภายใน กย.66
4	โรงพยาบาลโนนนารายณ์	100	3,245,600	กฟน.	เฉพาะเจาะจง	ร่าง คกก.TOR	รอหนังสือตอบรับจาก กฟน.
5	โรงพยาบาลสนม	100	3,245,600	กฟน.	เฉพาะเจาะจง	ร่าง คกก.TOR อยู่ระหว่างปรับปรุงหลังคา	แต่งตั้ง คกก. TOR ใน 30/09/2566
6	โรงพยาบาลท่าตูม	200	6.700.000	กฟภ.	E-bidding	อยู่ระหว่างรอ กฟภ. พิจารณา ระยะ 3	อยู่ระหว่างปรับปรุงหลังคาอาคาร ผู้ป่วย IPD 2 และ 3
7.	โรงพยาบาลศรีณรงค์	80	รอกการประเมิน	กฟภ.	E-bidding	อยู่ระหว่างรอ กฟภ. พิจารณา	รอ กฟภ. เข้าประเมินพื้นที่



# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6

กลุ่มโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ กภพ.

ลำดับ	หน่วยงาน	กภพ. ระยะที่	ร่วมมือกับ	ขนาด KW	งบประมาณ (บาท)	การจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการ (25 กค 66)	ความก้าวหน้า (23 สค 66)
1	รพ.กาบเชิง	1	กภพ.	100	3,000,000	E-bidding	ร่าง คกก.TOR ภายใน 21 ก.ค. 66	ลงนาม 15/9/66 เริ่มติดตั้ง 22/9/66 ส่งมอบ ภายใน ธค. 66
2	รพ.เขวาสินรินทร์	2/1	กภพ.	90	3,246,000	E-bidding	รอจัดสรรงบประมาณ / ร่าง คกก.TOR	(ร่าง) แต่งตั้ง คกก. TOR แล้วเสร็จใน กย.66
3	รพ.ลำโรงทาน	2/1	กภพ.	140	4,200,000	เฉพาะเจาะจง	รอจัดสรรงบประมาณ / ร่าง คกก.TOR (กภพ.)	แต่งตั้ง คกก. TOR ใน 30/09/2566
4	รพ.ลำดวน	2/1	กภพ.	120	3,600,000	เฉพาะเจาะจง	รอจัดสรรงบประมาณ / ร่าง คกก.TOR (กภพ.)	แต่งตั้ง คกก. TOR ใน 30/09/2566
5	รพ.บัวเชด	2/2	กภพ.	60	1,800,000	เฉพาะเจาะจง	รอจัดสรรงบประมาณ / ร่าง คกก.TOR (กภพ.)	แต่งตั้ง คกก. TOR ใน 30/09/2566
6	รพ.ชุมพลบุรี	2/2	กภพ.	135	4,050,000	เฉพาะเจาะจง	รอจัดสรรงบประมาณ / ร่าง คกก.TOR	แต่งตั้ง คกก. TOR 31/8/2566 แล้วเสร็จ
7	รพ.ท่าตูม	3		200	-	-	อยู่ระหว่างรอ กภพ. พิจารณา	
8.	รพ.ศรีณรงค์	-		100	-	-	อยู่ระหว่างรอ กภพ. พิจารณา	รอ กภพ. เข้าประเมินพื้นที่



# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

18

## กลุ่มหน่วยบริหาร ที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ	หน่วยงาน	ขนาด KW	แหล่ง งบประมาณ	การดำเนินการ (25 กค 66)	ความก้าวหน้า (23 สค 66)
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	100	งบเขต	ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ของ กพน.	ได้ผู้รับจ้าง 27/7/2566 ทำสัญญา 31/8/2566
2	สสอ.เมืองสุรินทร์	5	เงินบำรุง	ติดตั้งแล้ว 01/10/2565	-
3	สสอ.ลำโรงทับ	5	CUP	ติดตั้งแล้ว 22/06/2566	-
4	สสอ.โนนนารายณ์	5	CUP	ติดตั้งแล้ว 17/07/2566	-
5	สสอ.เขวาสินรินทร์	10	เงินบำรุง รพ.	ระหว่างจัดหางบประมาณ	ร่าง คกก. TOR กย. 66
6	สสอ.ปราสาท	10	เงินบำรุง รพ.	ระหว่างจัดหางบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งแผง/ส่งมอบใน กย.66
7	สสอ. 12 แห่ง	10	เงินบำรุง รพ.	ระหว่างจัดหางบประมาณ	อยู่ระหว่างโรงพยาบาลปรับแผนเงินบำรุง



# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

211

## กลุ่ม รพ.สต. ที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ	หน่วยงาน	ขนาด KW	แหล่งงบประมาณ	จำนวน (แห่ง)	ความก้าวหน้า
1	รพ.สต. ติดตั้งระบบแล้ว	7.5	กองอนุรักษ์พลังงาน	37	รพ.สต. ชายแดน ปี 2564
2	รพ.สต. ติดตั้งระบบแล้ว	5	เงินบำรุง	22	
2	รพ.สต. มีแผนติดตั้ง ปี 2566	5	เงินบำรุง	15	
3	รพ.สต. มีแผนติดตั้ง ปี 2567-68	5	CUP	60	
