



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
Surin Provincial Health Office

# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน



นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

30 เมษายน 2567




# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล 30 เมษายน 2567

รพ. 17 แห่ง, สสอ. 17 แห่ง, สสจ. 1 แห่ง รวม 35 แห่ง

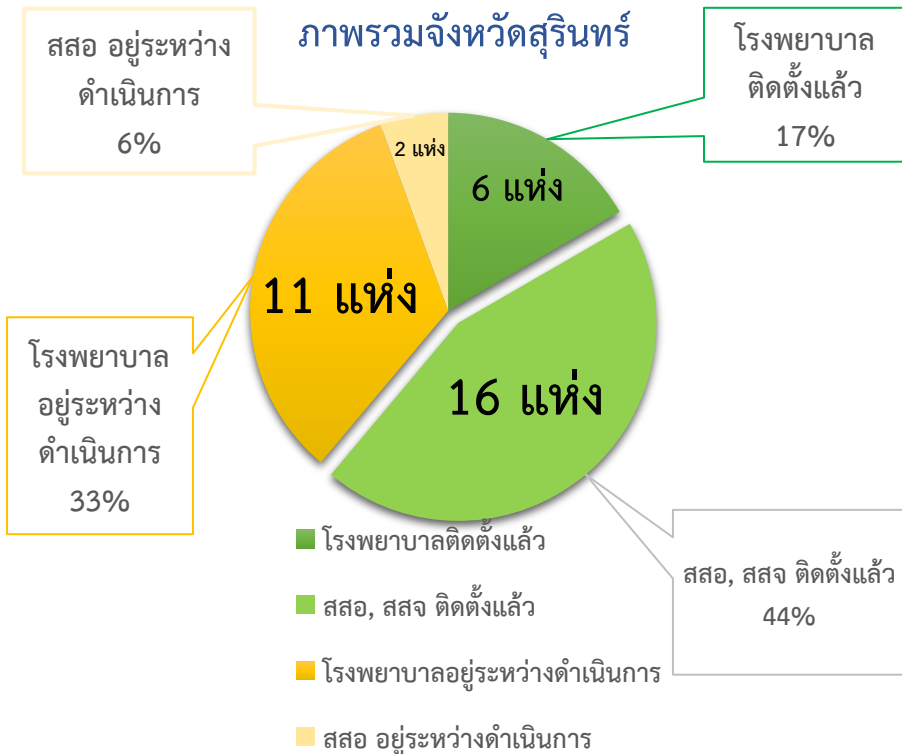

## ติดตั้งแล้ว 62.86%

1.รพ.พนมดงรักฯ 50KW	4.รพ.จอมพระ 100KW
2.รพ.ศีขรภูมิ 120KW	5.สำโรงทาบ 10KW
3.รพ.กาบเชิง 100KW	6.รพ.ท่าตูม 100KW
7.สสอ.เขวาสินรินทร์ 10KW	8.สสอ.จอมพระ 5KW
9.สสอ.ปราสาท 10KW	10.สสอ.โนนนารายณ์ 5KW
11.สสอ.พนมดงรัก 10KW	12.สสอ.เมือง 10KW
13.สสอ.ศีขรภูมิ 10KW	14.สสอ.สนม 10KW
15.สสอ.สำโรงทาบ 10KW	16.สสอ.ท่าตูม 6.6KW
17.สสอ.ลำดวน 10KW	18.สสจ.สุรินทร์ 100KW
19.สสอ.กาบเชิง 10KW	20.สสอ.รัตนบุรี 10KW
21.สสอ.สังขะ 10KW	22.สสอ.บัวเชด 10KW

## อยู่ระหว่างดำเนินการ 37.14%

1.รพ.สุรินทร์ 1,400KW	สัญญาซื้อไฟฟ้า	กฟน.	ติดสัญญาให้บริการ รอปลดมอบอำนาจฯ
2.รพ.สังขะ 590KW	สัญญาซื้อไฟฟ้า	กฟน.	ติดสัญญาให้บริการ รอปลดมอบอำนาจฯ
3.รพ.สนม 100KW	ซื้อขาย	กฟน.	ได้ผู้รับจ้าง/ส่งสัญญาลงนาม
4.รพ.โนนนารายณ์ 100KW	ซื้อขาย	เอกชน	มี TOR
5.รพ.ปราสาท 550KW	ซื้อขาย	เอกชน	คาดว่าจะทำสัญญาใน 31 มี.ค.67
6.รพ.รัตนบุรี 10KW	ซื้อขาย	เอกชน	(10KW-TOR) – รอ กทพ.3
7.รพ.ลำดวน 120KW	กทพ. ระยะที่ 2/1	กฟภ.	อยู่ในกระบวนการเตรียมเอกสารเบิกเงิน งบ กทพ2
8.รพ.เขวาสินรินทร์ 90KW	กทพ. ระยะที่ 2/1	กฟภ.	จัดทำ TOR/รออนุมัติจัดซื้อตามกระบวนการ
9.รพ.ชุมพลบุรี 135KW	กทพ. ระยะที่ 2/2	กฟภ.	รออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
10.รพ.บัวเชด 60KW	กทพ. ระยะที่ 2/2	กฟภ.	รออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
11.รพ.ศรีณรงค์ 100KW	กทพ. ระยะที่ 3		ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
12.สสอ.ชุมพลบุรี 10KW	ซื้อขาย	เอกชน	ร่าง TOR/คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ 30/06/2567
13.สสอ.ศรีณรงค์ 10KW	ซื้อขาย	เอกชน	ปรับแผนเงินบำรุง /คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ 15/05/2567



มีนาคม : ติดตั้งแล้ว 60%, กำลังดำเนินการ 40%

เมษายน : ติดตั้งแล้ว 62.86%, กำลังดำเนินการ 37.14%

+ 1 โรงพยาบาลติดตั้งแล้วเสร็จล่าสุด

โรงพยาบาลท่าตูม




# โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล 30 เมษายน 2567

จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 212 แห่ง

## โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ติดตั้ง Solar Cell

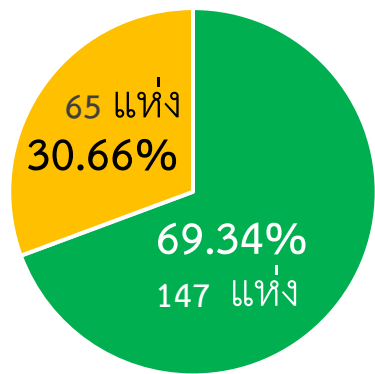

■ ติดตั้งแล้ว ■ ยังไม่ติดตั้ง



มี.ค. : ติดตั้งแล้ว 64.62%, กำลังดำเนินการ 35.38%

เม.ย. : ติดตั้งแล้ว 69.34%, กำลังดำเนินการ 30.66%

**+ 12 รพ.สต. ติดตั้งแล้วเสร็จล่าสุด**

- รพ.สต.เจนิยง
- รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร
- รพ.สต.บ้านหลักวอ
- รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
- รพ.สต.ตาภู
- รพ.สต.ปราสาททอง
- รพ.สต.โคกยาง
- รพ.สต.โคกสะอาด
- รพ.สต.ตาเบา
- รพ.สต.ทมอ
- รพ.สต.บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่
- รพ.สต.ประทีป

## รายละเอียด รพ.สต. ที่ติดตั้ง Solar Cell แล้ว จำแนกตามอำเภอ (จากมากไปน้อย)

อำเภอ	จำนวน รพ.สต.	จำนวนติดตั้งแล้ว	ติดตั้งแล้วร้อยละ	จำนวนยังไม่ติดตั้ง	ร้อยละที่ยังไม่ติดตั้ง
ท่าตูม	17	17	100	0	0
บัวเชด	8	8	100	0	0
รัตนบุรี	15	15	100	0	0
ลำดวน	5	5	100	0	0
ศรีณรงค์	6	6	100	0	0
สนม	10	10	100	0	0
สังขะ	18	18	100	0	0
สำโรงทาบ	11	11	100	0	0
กาบเชิง	10	9	90	1	10
เมืองสุรินทร์	25	20	80	5	20
ชุมพลบุรี	13	10	77	3	23
เขวาสินรินทร์	5	2	40	3	60
จอมพระ	11	4	36	7	64
ปราสาท	23	6	26	17	74
ศีขรภูมิ	21	5	24	16	76
โนนนารายณ์	7	1	14	6	86
พนมดงรัก	7	0	0	7	100
			ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว		กำลังดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>212</b>	<b>147</b>	<b>69.34</b>	<b>65</b>	<b>30.66</b>
